SH
Landesbetrieb
Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein
Niederlassung Lübeck

GSP Ingenieurgesellschaft mbH
Gosch-Schreyer-Partner
Beratende Ingenieure (VBI)

INGENIEURGEMEINSCHAFT
• STORM • BÜRAU •
GbR
Planung • Beratung • Bauleitung • Projektsteuerung

Fritz-Reuter-Straße 9
23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881/718191, Fax: 718393

Gartenstraße 2
23611 Bad Schwartau
Tel.: 0451/8104626, Fax: 8104627

L 287
Grundhafte Sanierung mit Gehweg in Lehmrade



Ergänzendes Abstimmungsgespräch gemäß § 45(2) StVO über die Verkehrsführung während der Bauzeit am 19.03.2019 im Dorfgemeinschaftshaus Lehmrade

Lage der Baustelle: Übersichtskarte

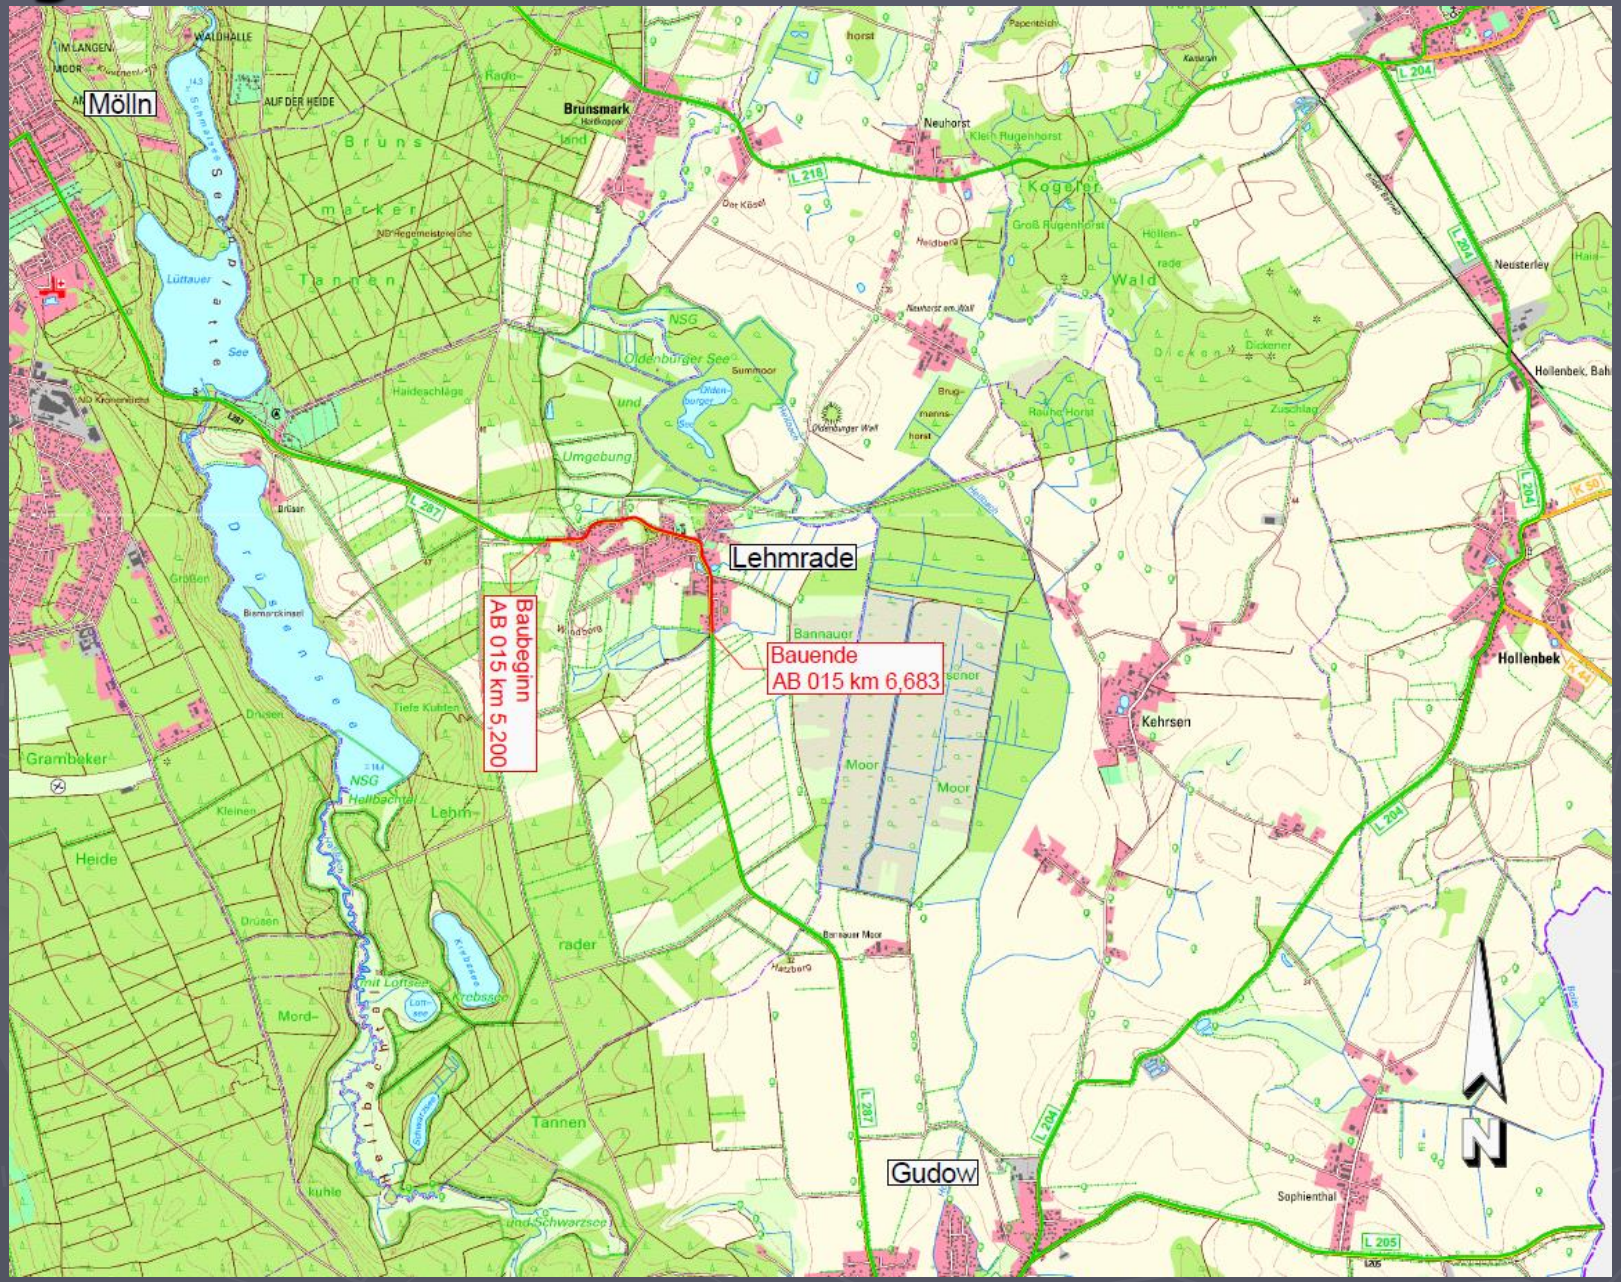

Lage der Baustelle: Übersichtsplan

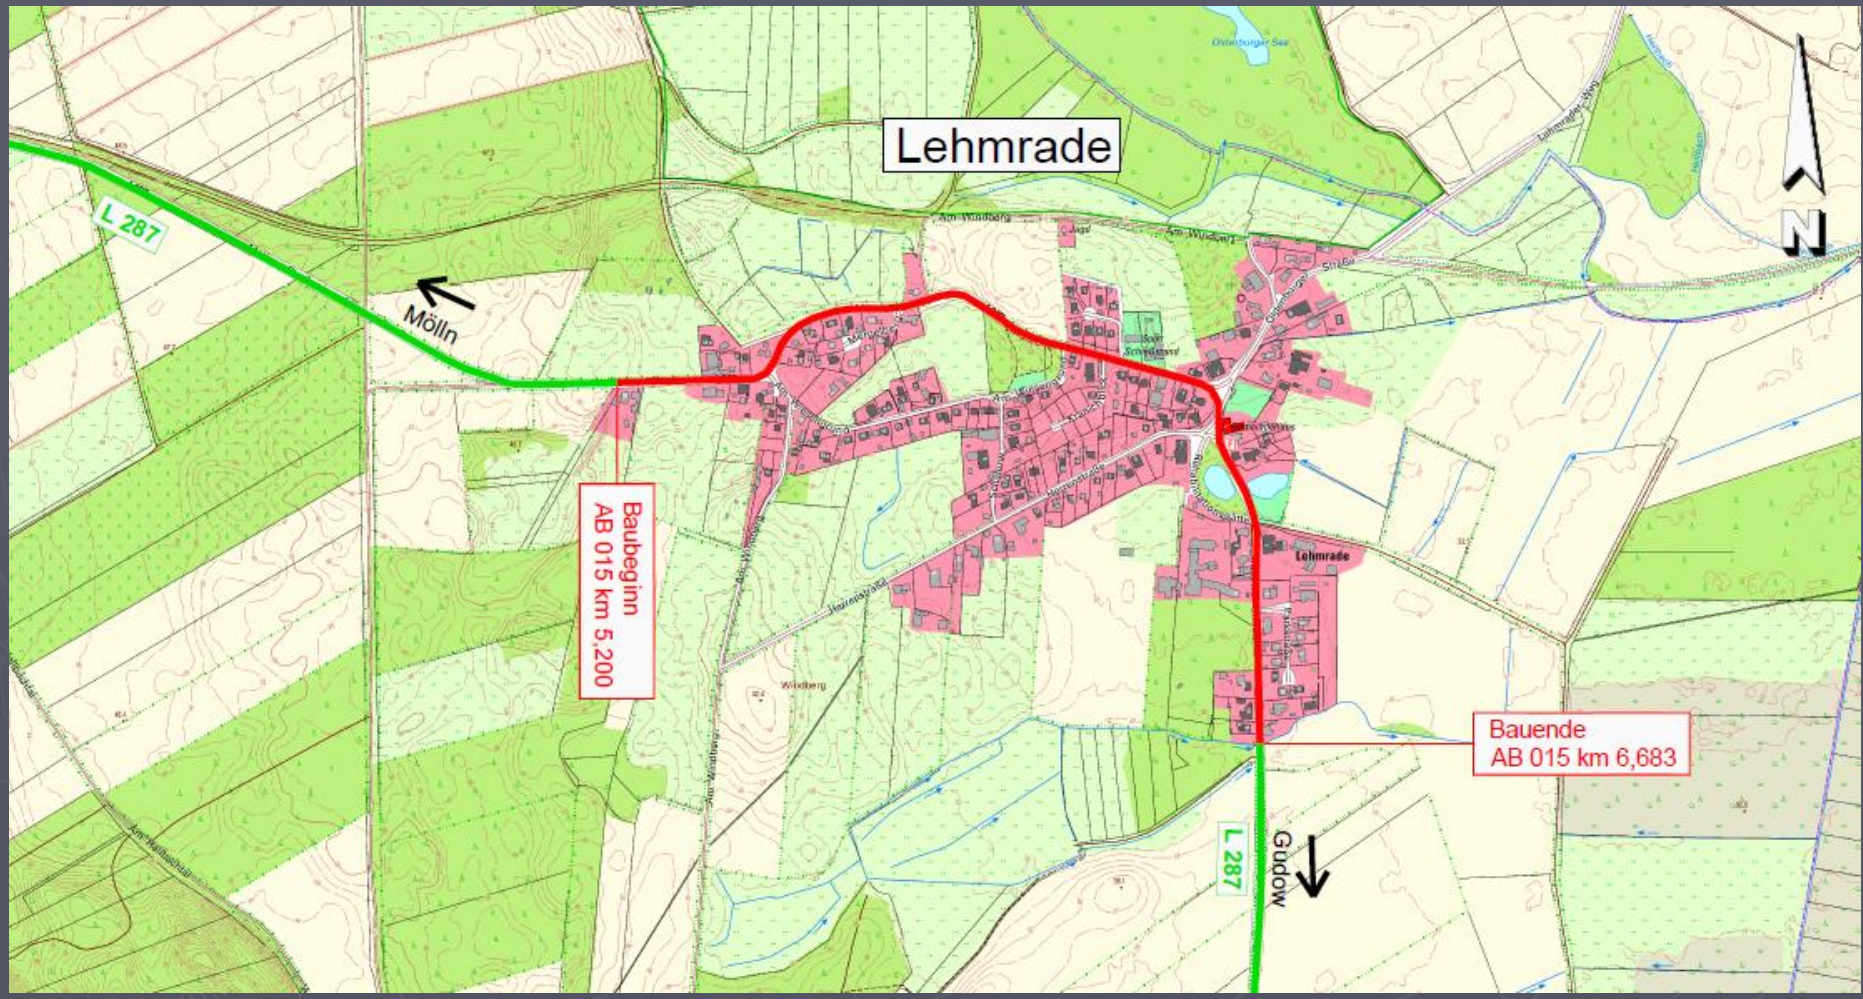

Umleitung: gesamte Bauzeit

Umleitung

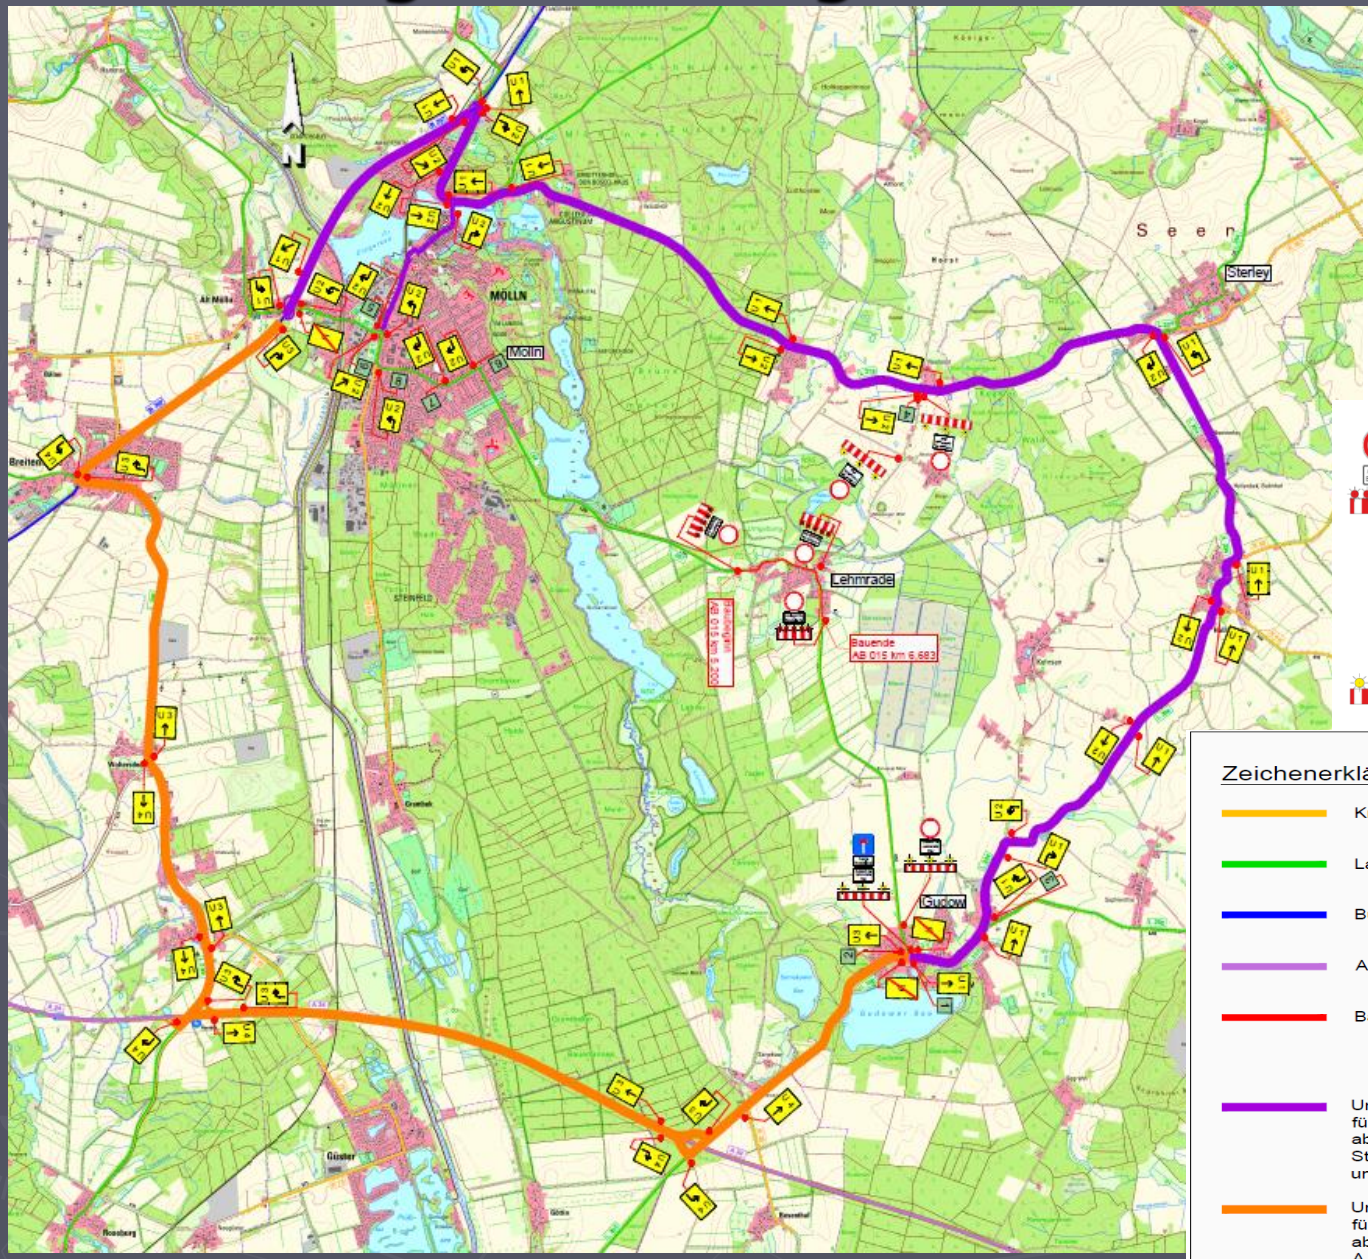

Vollsperrung der L 287
mit Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs bis zur Baustelle
21. – 25.10.2019
Vollsperrung gesamte Baustrecke für Deckschichteinbau

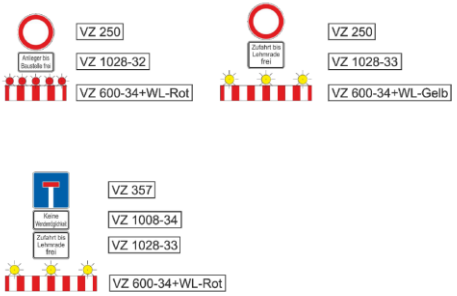

Zeichenerklärung:

- Kreisstraße
- Landesstraße
- Bundesstraße
- Autobahn
- Baustrecke
- Umleitung U1 / U2
  für Vollsperrung der L 287
  ab Mölln über Vorkamp, B 207, L 199, L 218, Sterley, L 204, Hollenbek, L 205 nach Gudow und umgekehrt
- Umleitung U3 / U4
  für Vollsperrung der L 287
  ab Mölln über B 205, Breitenfelde, L 200, A 24, L 205, Gudow und umkehrte

Umleitung: gesamte Bauzeit

Umleitung

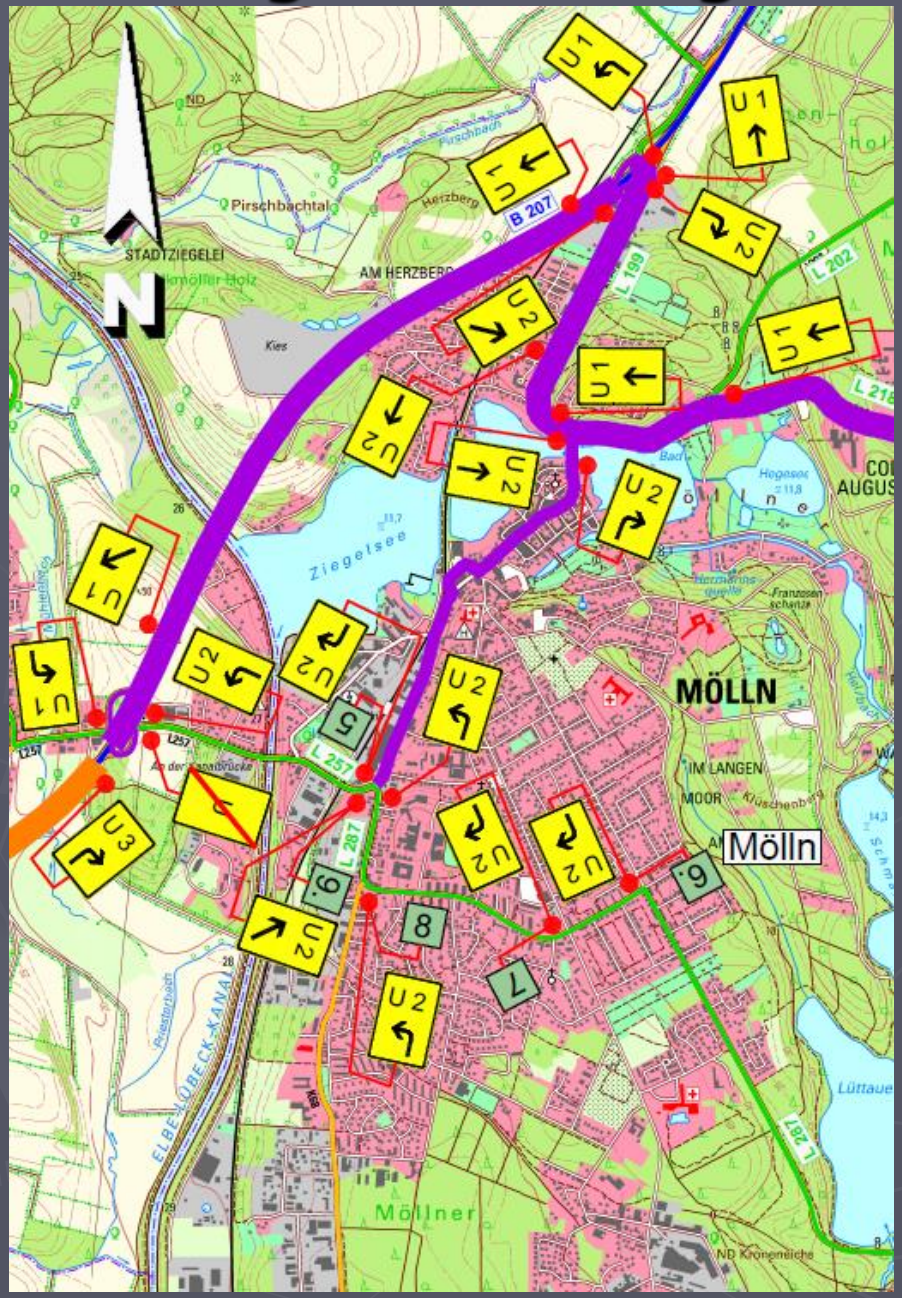

Vollsperrung der L 287
mit Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs bis zur Baustelle
21. – 25.10.2019
Vollsperrung gesamte Baustrecke für Deckschichteinbau

Zeichenerklärung:

- Kreisstraße
- Landesstraße
- Bundesstraße
- Autobahn
- Baustrecke
- Umleitung U1 / U2 für Vollsperrung der L 287 ab Mölln über Vorkamp, B 207, L 199, L 218, Sterley, L 204, Hollenbek, L 205 nach Gudow und umgekehrt
- Umleitung U3 / U4 für Vollsperrung der L 287 ab Mölln über B 205, Breitenfelde, L 200, A 24, L 205, Gudow und umkehrte

Umleitung: gesamte Bauzeit

Umleitung

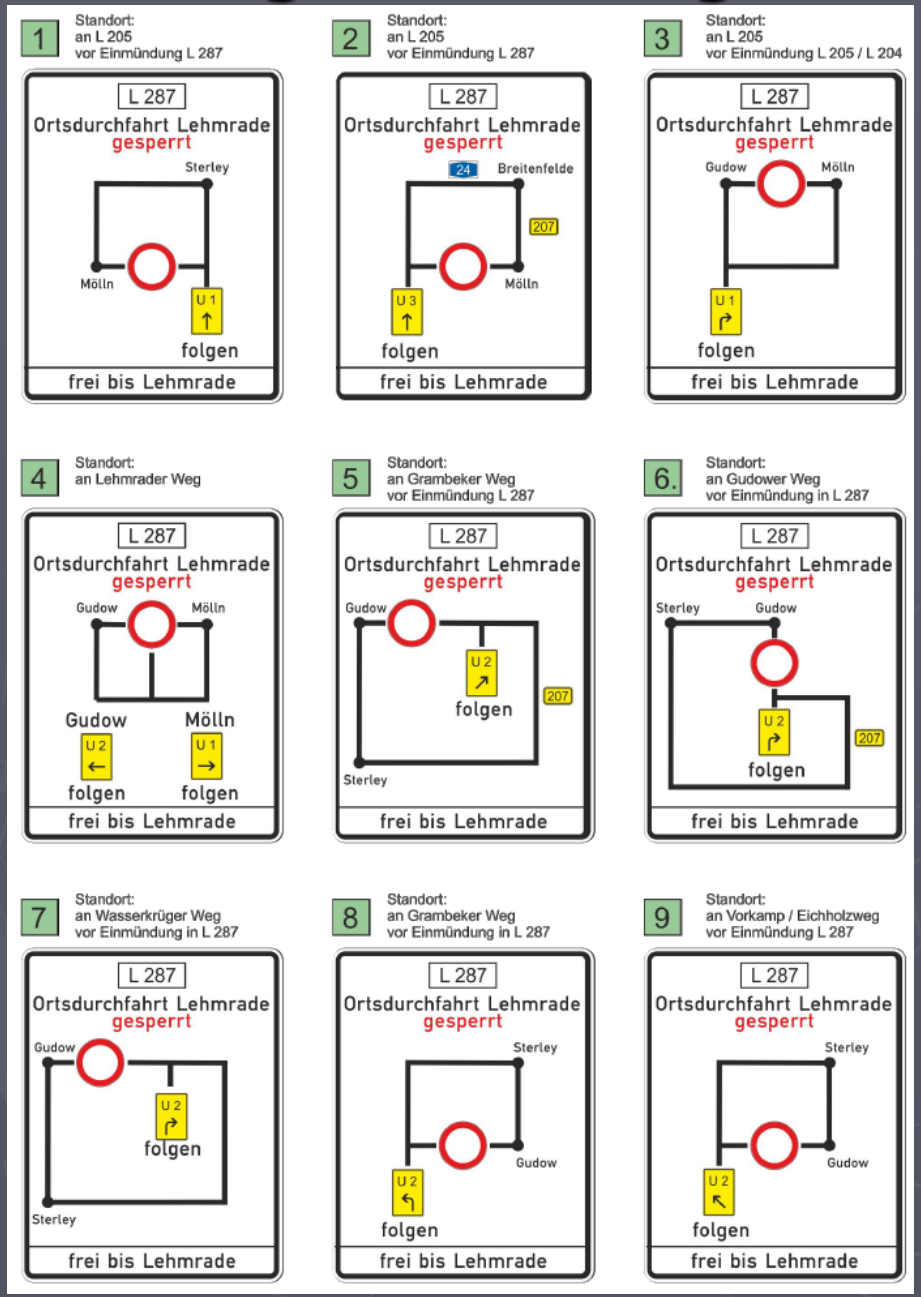

Vollsperrung der L 287
mit Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs bis zur Baustelle
21. – 25.10.2019
Vollsperrung gesamte Baustrecke für Deckschichteinbau

Aufteilung in vier Bauphasen

Bauphase 1 - Baustelleneinrichtung

- Mo. 25. März bis Fr. 05. April 2019, entsprechend 2 Wochen
- Gesamte Baustrecke, ~ 1.485 m
- Einrichtung der Umleitungen U1 bis U4
- Vollsperrung der L 287 für den Durchgangsverkehr (Anlieger- / Liefer- und Busverkehr frei)
- Halbseitige Bauweise mit Ampelregelung nach verkehrlichen Erfordernissen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in beiden Richtungen
- Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten, Absteckarbeiten, Stubben roden etc.

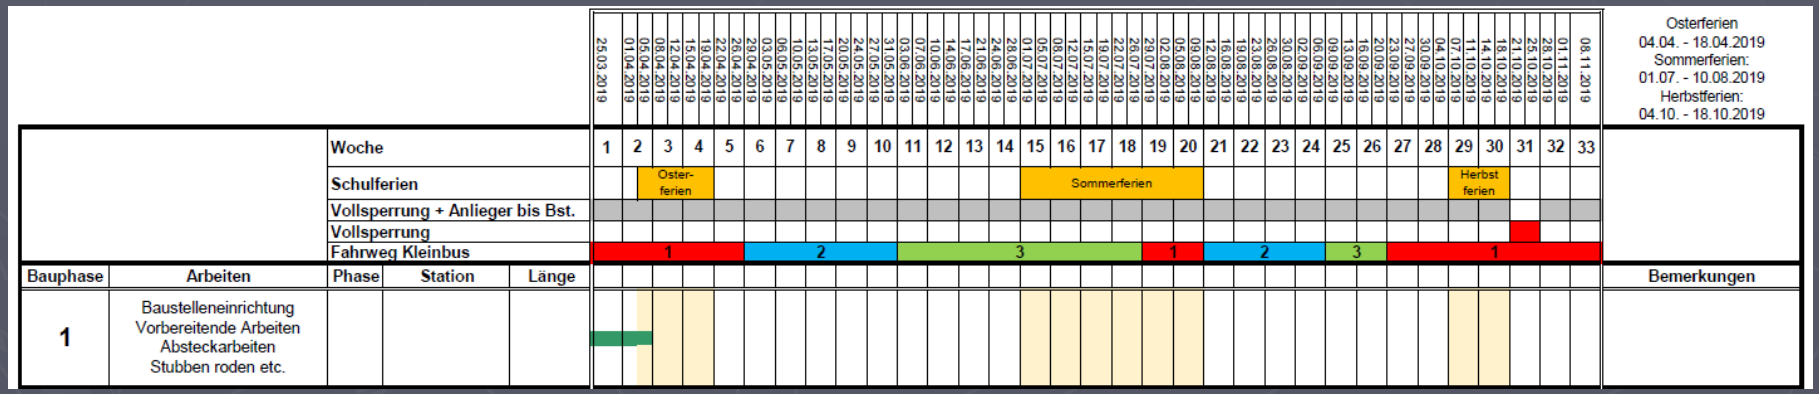

Aufteilung in vier Bauphasen

Bauphase 2 - Kanalbau

- Mo. 08. April bis Fr. 26. Juli 2019, entsprechend 16 Wochen
- Vollsperrung der L 287 für den Durchgangsverkehr (Anlieger- / Liefer- und Busverkehr bis zur Baustelle frei)
- Aufteilung in 2 Abschnitte mit zeitgleicher Ausführung mit entsprechendem Personaleinsatz
- Weitere Aufteilung in 11 Teilabschnitte zu 70 bis 250 m Länge
- Halbseitige Bauweise mit Ampelregelung nach verkehrlichen Erfordernissen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in beiden Richtungen, sofern platztechnisch möglich (Teilabschnitte 2.b.3 und 2.a.1)
- Rohrleitungs- und Entwässerungsarbeiten einschließlich Hauptkanal, Durchlässe, ggf. Hausanschlussleitungen, Verfüllung Rohrgräben, Straßenabläufe, Pflasterstreifen, Bordsteine und Gehwege, Versorgungsleitungen

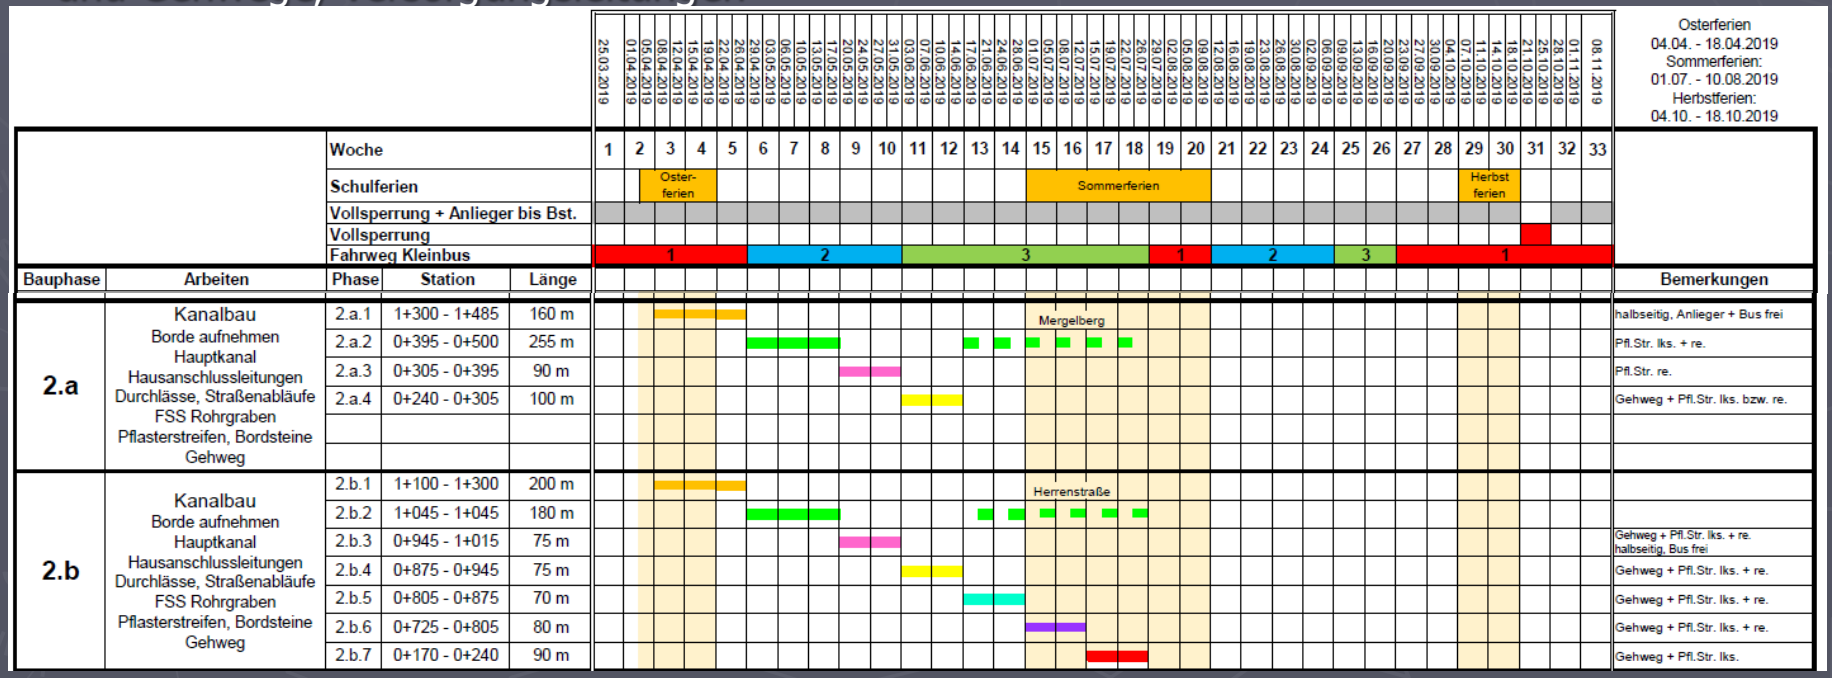

Aufteilung in vier Bauphasen

Bauphase 2 - Kanalbau

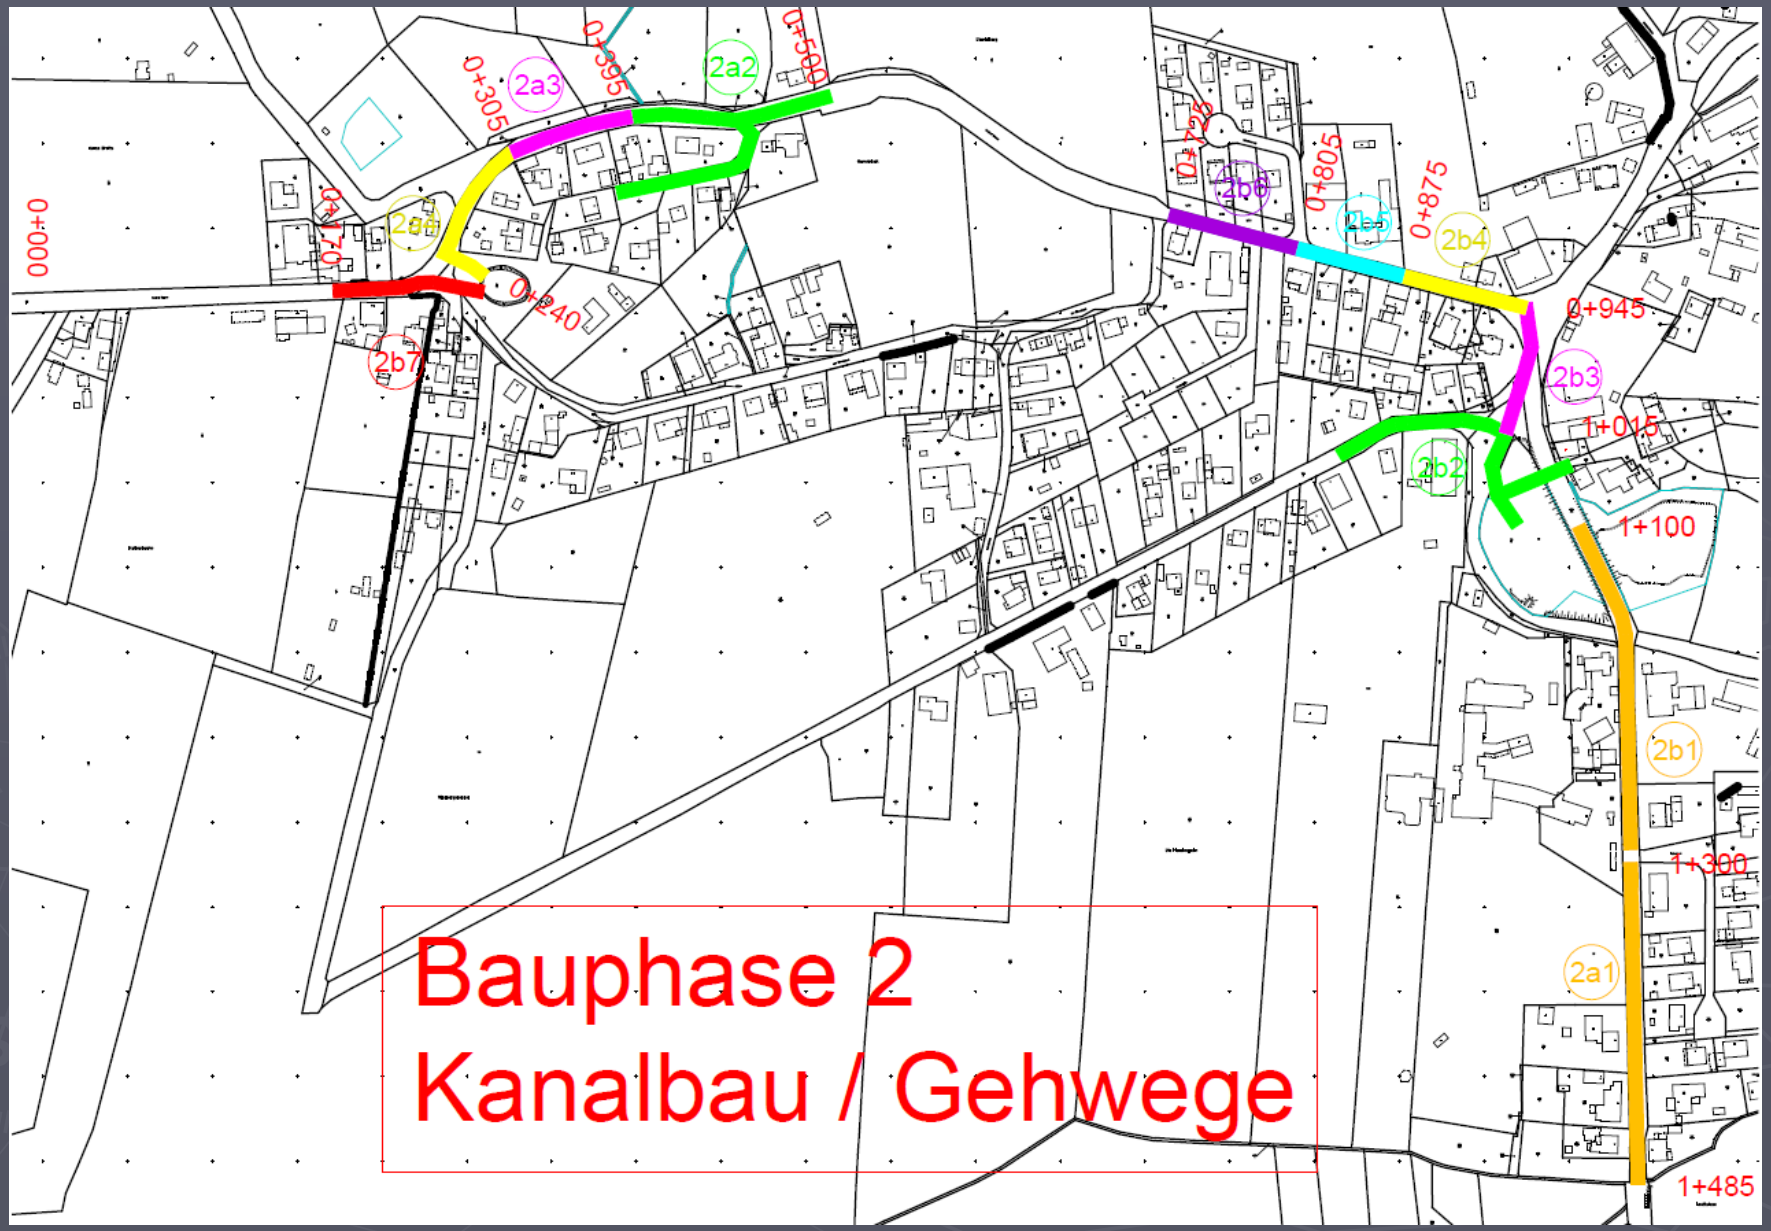

Aufteilung in vier Bauphasen

Bauphase 3 - Straßenbau

- Mo. 29. Juli bis Fr. 25. Oktober 2019, entsprechend 13 Wochen
- Vollsperrung der L 287 für den Durchgangsverkehr (Anlieger- / Liefer- und Busverkehr bis zur Baustelle frei)
- Aufteilung in 6 Teilabschnitte zu 200 bis 335 m Länge, ggf. weitere Aufteilung
- Bauausführung pro Abschnitt und nacheinander
- Straßenbau (Vollausbau Fahrbahn: Ausbau Asphalt + ungebundene Tragschichten, Einbau Frostschutzschicht, Asphalttragschicht
- Einbau Asphaltdeckschicht auf ganzer Länge und Vollsperrung (Mo. 21. bis Fr. 25. Oktober 2019

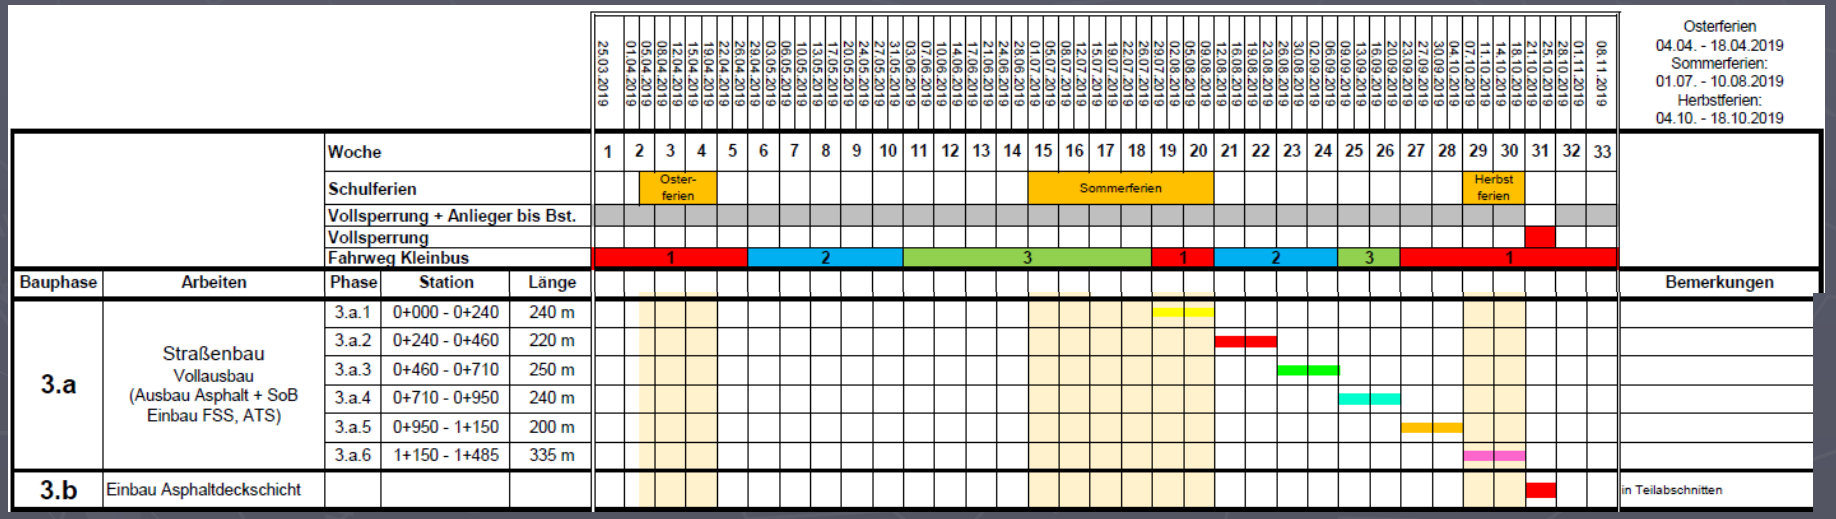

Aufteilung in vier Bauphasen

Bauphase 3 - Straßenbau

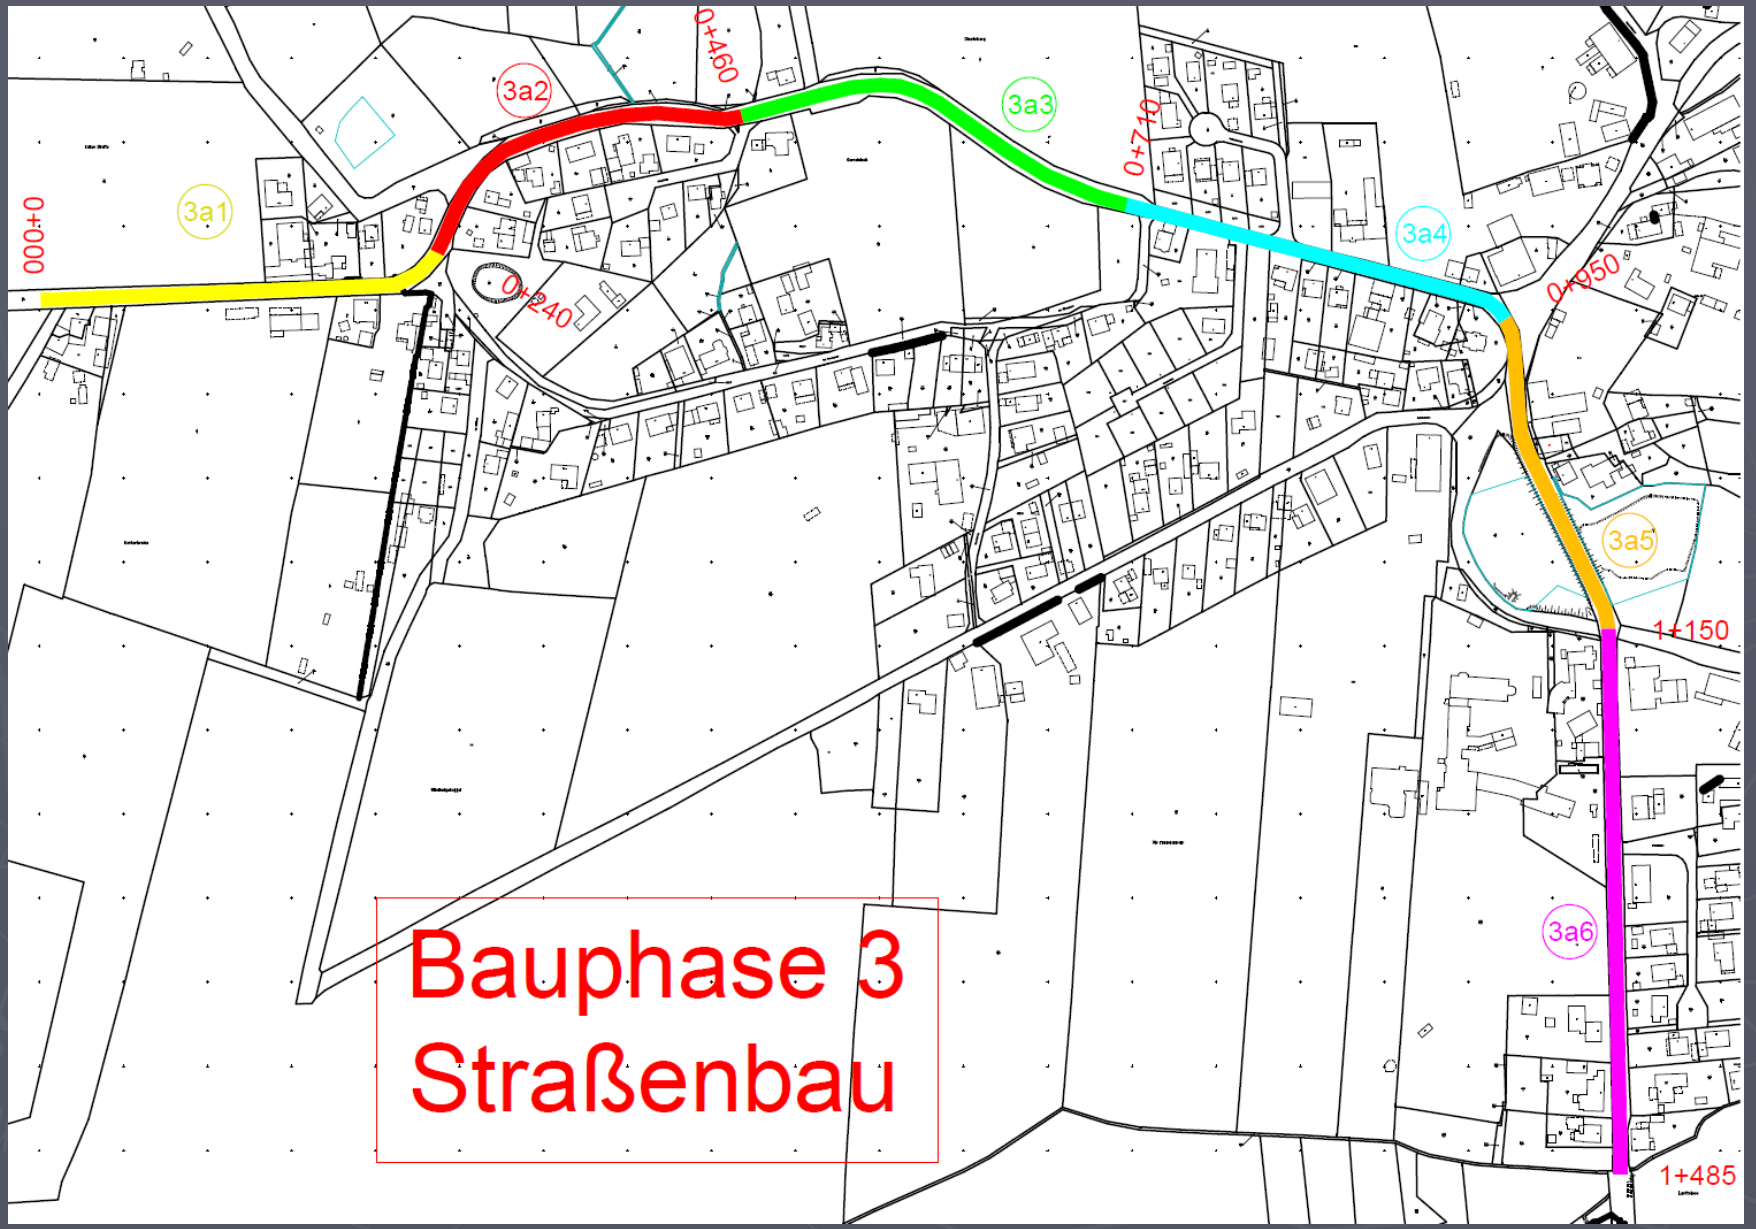

Aufteilung in vier Bauphasen

Bauphase 4 – Bus / Beleuchtung

- Während Bauphase 4
- Innerhalb Sommerferien
- Umbau Bushaltestellen
- Neuregelung der Straßenbeleuchtung

Bauphase 5 - Baustellenräumung

- Mo. 28. Oktober bis Fr. 08. November 2019, entsprechend 2 Wochen
- Gesamte Baustrecke
- Rand- und Restarbeiten, Baustellenräumung etc.

- Vollsperrung der L 287 für den Durchgangsverkehr (Anlieger- / Liefer- und Busverkehr frei)
- Halbseitige Bauweise mit Ampelregelung nach verkehrlichen Erfordernissen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in beiden Richtungen

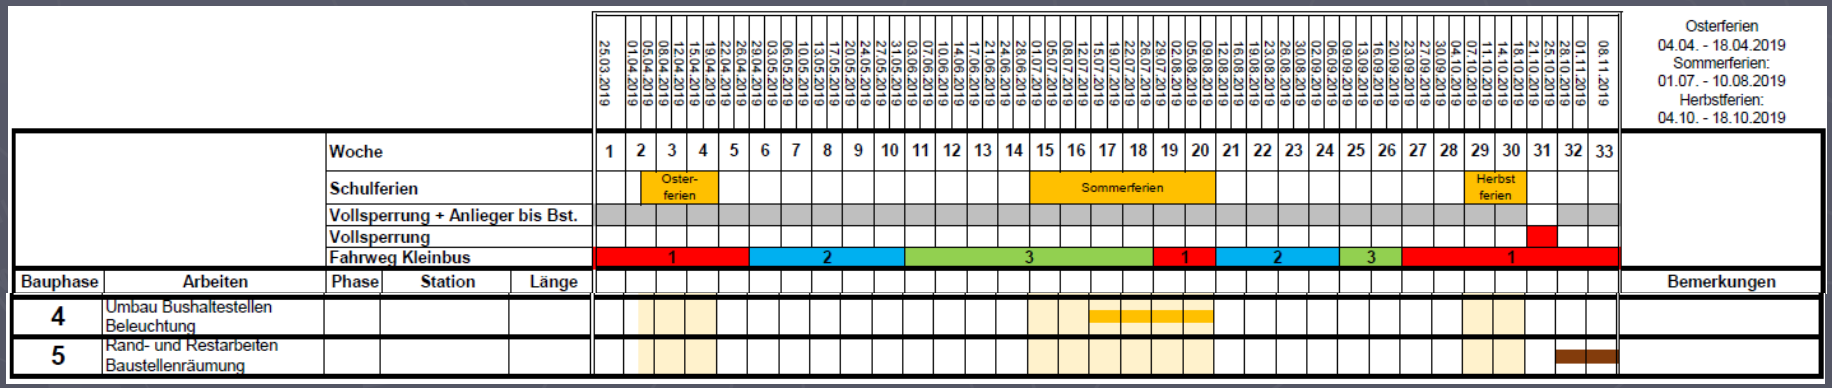

Schulbusverkehr während der Bauzeit

Mi. 13.03.2019 Besprechung mit Gemeinde, Kreis und Busunternehmen bzgl. Schulbusverkehr inkl. anschließender Bürgerfragestunde.

Der Linien und Schulbusverkehr befährt während der Bauzeit die ausgewiesene Umleitung.

Schülerinnen und Schüler aus Lehmrade werden mit Kleinbussen von den Bushaltestellen „Am Wiesengrund" und „Oldenburger Straße" abgeholt und über die Oldenburger Straße zur Bushaltestelle Neuhorst gebracht, wo der Umstieg in den regulären Bus erfolgt.

8754

Montag-Freitag

Hinweise												
Linie	Klenbus	8754	8754	8754	Klenbus	8754	8850	8754	8754	8754	8754	8754
Regrahn			06:30									
Busankunft Linie 8852 aus Büchen											13:37	
Gudow, Zarrentiner Str.		06:32	06:36	06:56		07:24	07:31				13:37	15:25
Busabfahrt Linie 8852 nach Büchen			06:37									
Sophienthal, Am Sandbrink		06:36	|	07:00		07:28	07:34				13:41	15:29
Sophienthal, Dorfstraße		06:37	|	07:01		07:29	07:35				13:42	15:30
Kehrsen, Im Schlingen		06:43	|	07:07		07:35	07:41				13:48	15:36
Kehrsen, Schmiedeberg		06:44	|	07:08		07:36	07:42				13:49	15:37
Kehrsen, Groß Felln		06:46	|	07:10		07:38	07:44				13:51	15:39
Hollenbek, Marienteicher Straße		06:47	|	07:11		07:39	07:45				13:52	15:40
Hollenbek, Schoolsteg		06:48	|	07:12		07:40	07:46				13:53	15:41
Hollenbek, Alter Bahnhof		06:50	|	07:14		07:42	07:48				13:55	15:43
Neu Sterley		06:51	|	07:15		07:43	07:50					
Sterley, Mühlenweg		|	|	07:17		|	07:51					
Sterley, Alte Dorfstraße		|	|	07:18		|	07:52					
Sterley, Am Burggraben		|	|	07:19		|	07:52					
Schulende GS Sterley								12:10	13:00			
Sterley, Schule		|	|	07:20		|	07:53	12:20	13:16		
Schulende GS Sterley				07:20				08:25				
Sterley, Kirche		|	|			|	07:54	12:21	13:17		
Sterley, Alte Dorfstraße		|	|			|	07:55	12:22	13:18		
Neu Horst, Alter Gutshof		06:56	06:52			07:48	07:58	12:25	13:21			
Lehmrade, Am Wiesengrund (Ersatz)	06:42	|	|		07:34	|	|	|	|			
Lehmrade, Oldenburger Straße (Ersatz)	06:43	|	|		07:37	|	|	|	|			
Neu Horst, Am Käsel	06:50	06:57	06:53		07:42	07:49	07:59	12:26	13:22			
Brunsmark, Dorfstraße		06:59	06:55			07:51	08:01	12:28	13:24			
Mölln, Pater-Lenner-Weg		07:02	06:58			07:54	08:04	12:31	13:27			
Mölln, Landwirtschaftsschule		07:03	06:59			07:55	08:06	12:32	13:28			
Mölln, Wassertor (Schmilauer Str.)		07:04	07:00			07:56	08:07	12:33	13:29			
Mölln, Marktstraße		07:06	07:02			07:58	08:09	12:35	13:31			
Mölln, ZOB		07:08	07:04			08:00	08:19	12:37	13:33			
Bf. Mölln		07:09	07:05			08:01	08:15					
Mölln, Hempschört		07:10	07:06			08:02						
Mölln, Grambeker Weg		07:11	07:07			08:03						
Mölln, Schulberg		07:14	07:10			08:06						
Schulbeginn Gemeinschaftsschule		07:25	07:19			08:16						
Schulbeginn TSR-Eulenspiegel-GS		07:30	07:30			08:20						
Schulbeginn Gymnasium Mölln		07:30	07:30									
Mölln, Grundschule Tarneck		07:20				08:12						
Schulbeginn GS Tarneck		07:30	07:30			08:15						

* an Schultagen in 5-H während der Sperrung OD Lehmrade (voraussichtlich 23.04. - 08.11.2019)
\+ = Fahrt der Linie 8850 (Richtung Mölln)

Hierfür wurde ein Umleitungsfahrplan für die Linie 8754 entwickelt und verteilt.

Des Weiteren fährt die Kleinbuslinie 8514 von Mölln über Drüsen nach Lehmrade „Oldenburger Straße" und zurück.

Für den Fahrweg der Kleinbusse innerhalb Lehmrade wurden drei Fahrwege entwickelt, die in Abhängigkeit der Bauabschnitte für den Kleinbus befahrbar bleiben sollen:

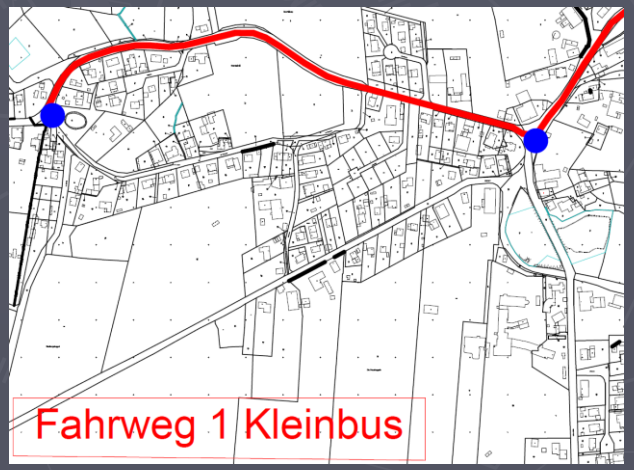

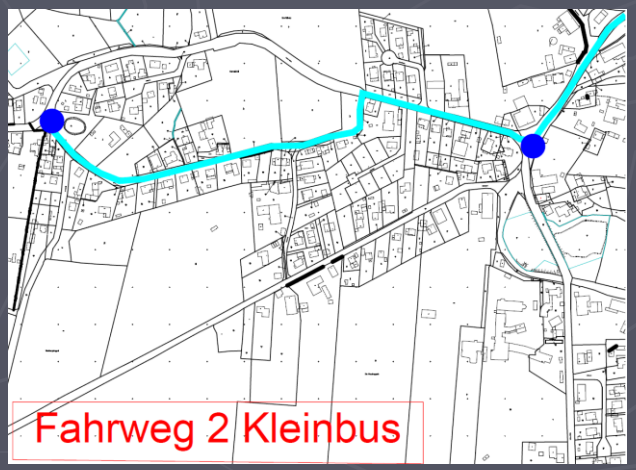

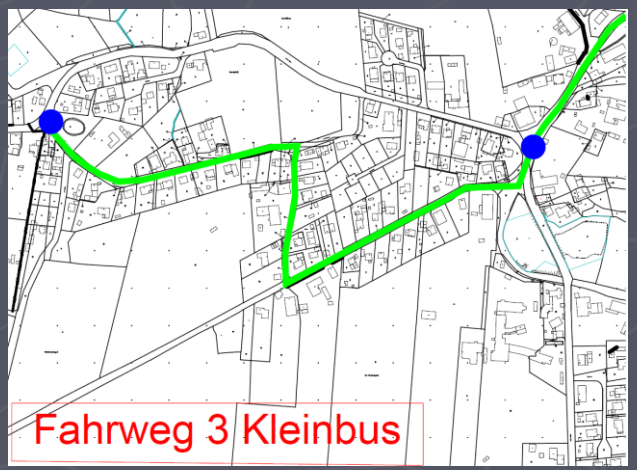

Fahrwege Kleinbus

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	25.03.2019	01.04.2019 05.04.2019	08.04.2019 12.04.2019	15.04.2019 19.04.2019	22.04.2019 26.04.2019	29.04.2019 03.05.2019	06.05.2019 10.05.2019	13.05.2019 17.05.2019	20.05.2019 24.05.2019	27.05.2019 31.05.2019	03.06.2019 07.06.2019	10.06.2019 14.06.2019	17.06.2019 21.06.2019	24.06.2019 28.06.2019	01.07.2019 05.07.2019	08.07.2019 12.07.2019	15.07.2019 19.07.2019	22.07.2019 26.07.2019	29.07.2019 02.08.2019	05.08.2019 09.08.2019	12.08.2019 16.08.2019	19.08.2019 23.08.2019	26.08.2019 30.08.2019	02.09.2019 06.09.2019	09.09.2019 13.09.2019	16.09.2019 20.09.2019	23.09.2019 27.09.2019	30.09.2019 04.10.2019	07.10.2019 11.10.2019	14.10.2019 18.10.2019	21.10.2019 25.10.2019	28.10.2019 01.11.2019	08.11.2019
Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Schulferien			Oster-ferien														Sommerferien												Herbst ferien				
Vollsperrung + Anlieger bis Bst.																																	
Vollsperrung																																	
Fahrweg Kleinbus			1					2							3				1			2			3					1			

Osterferien
04.04. - 18.04.2019
Sommerferien:
01.07. - 10.08.2019
Herbstferien:
04.10. - 18.10.2019

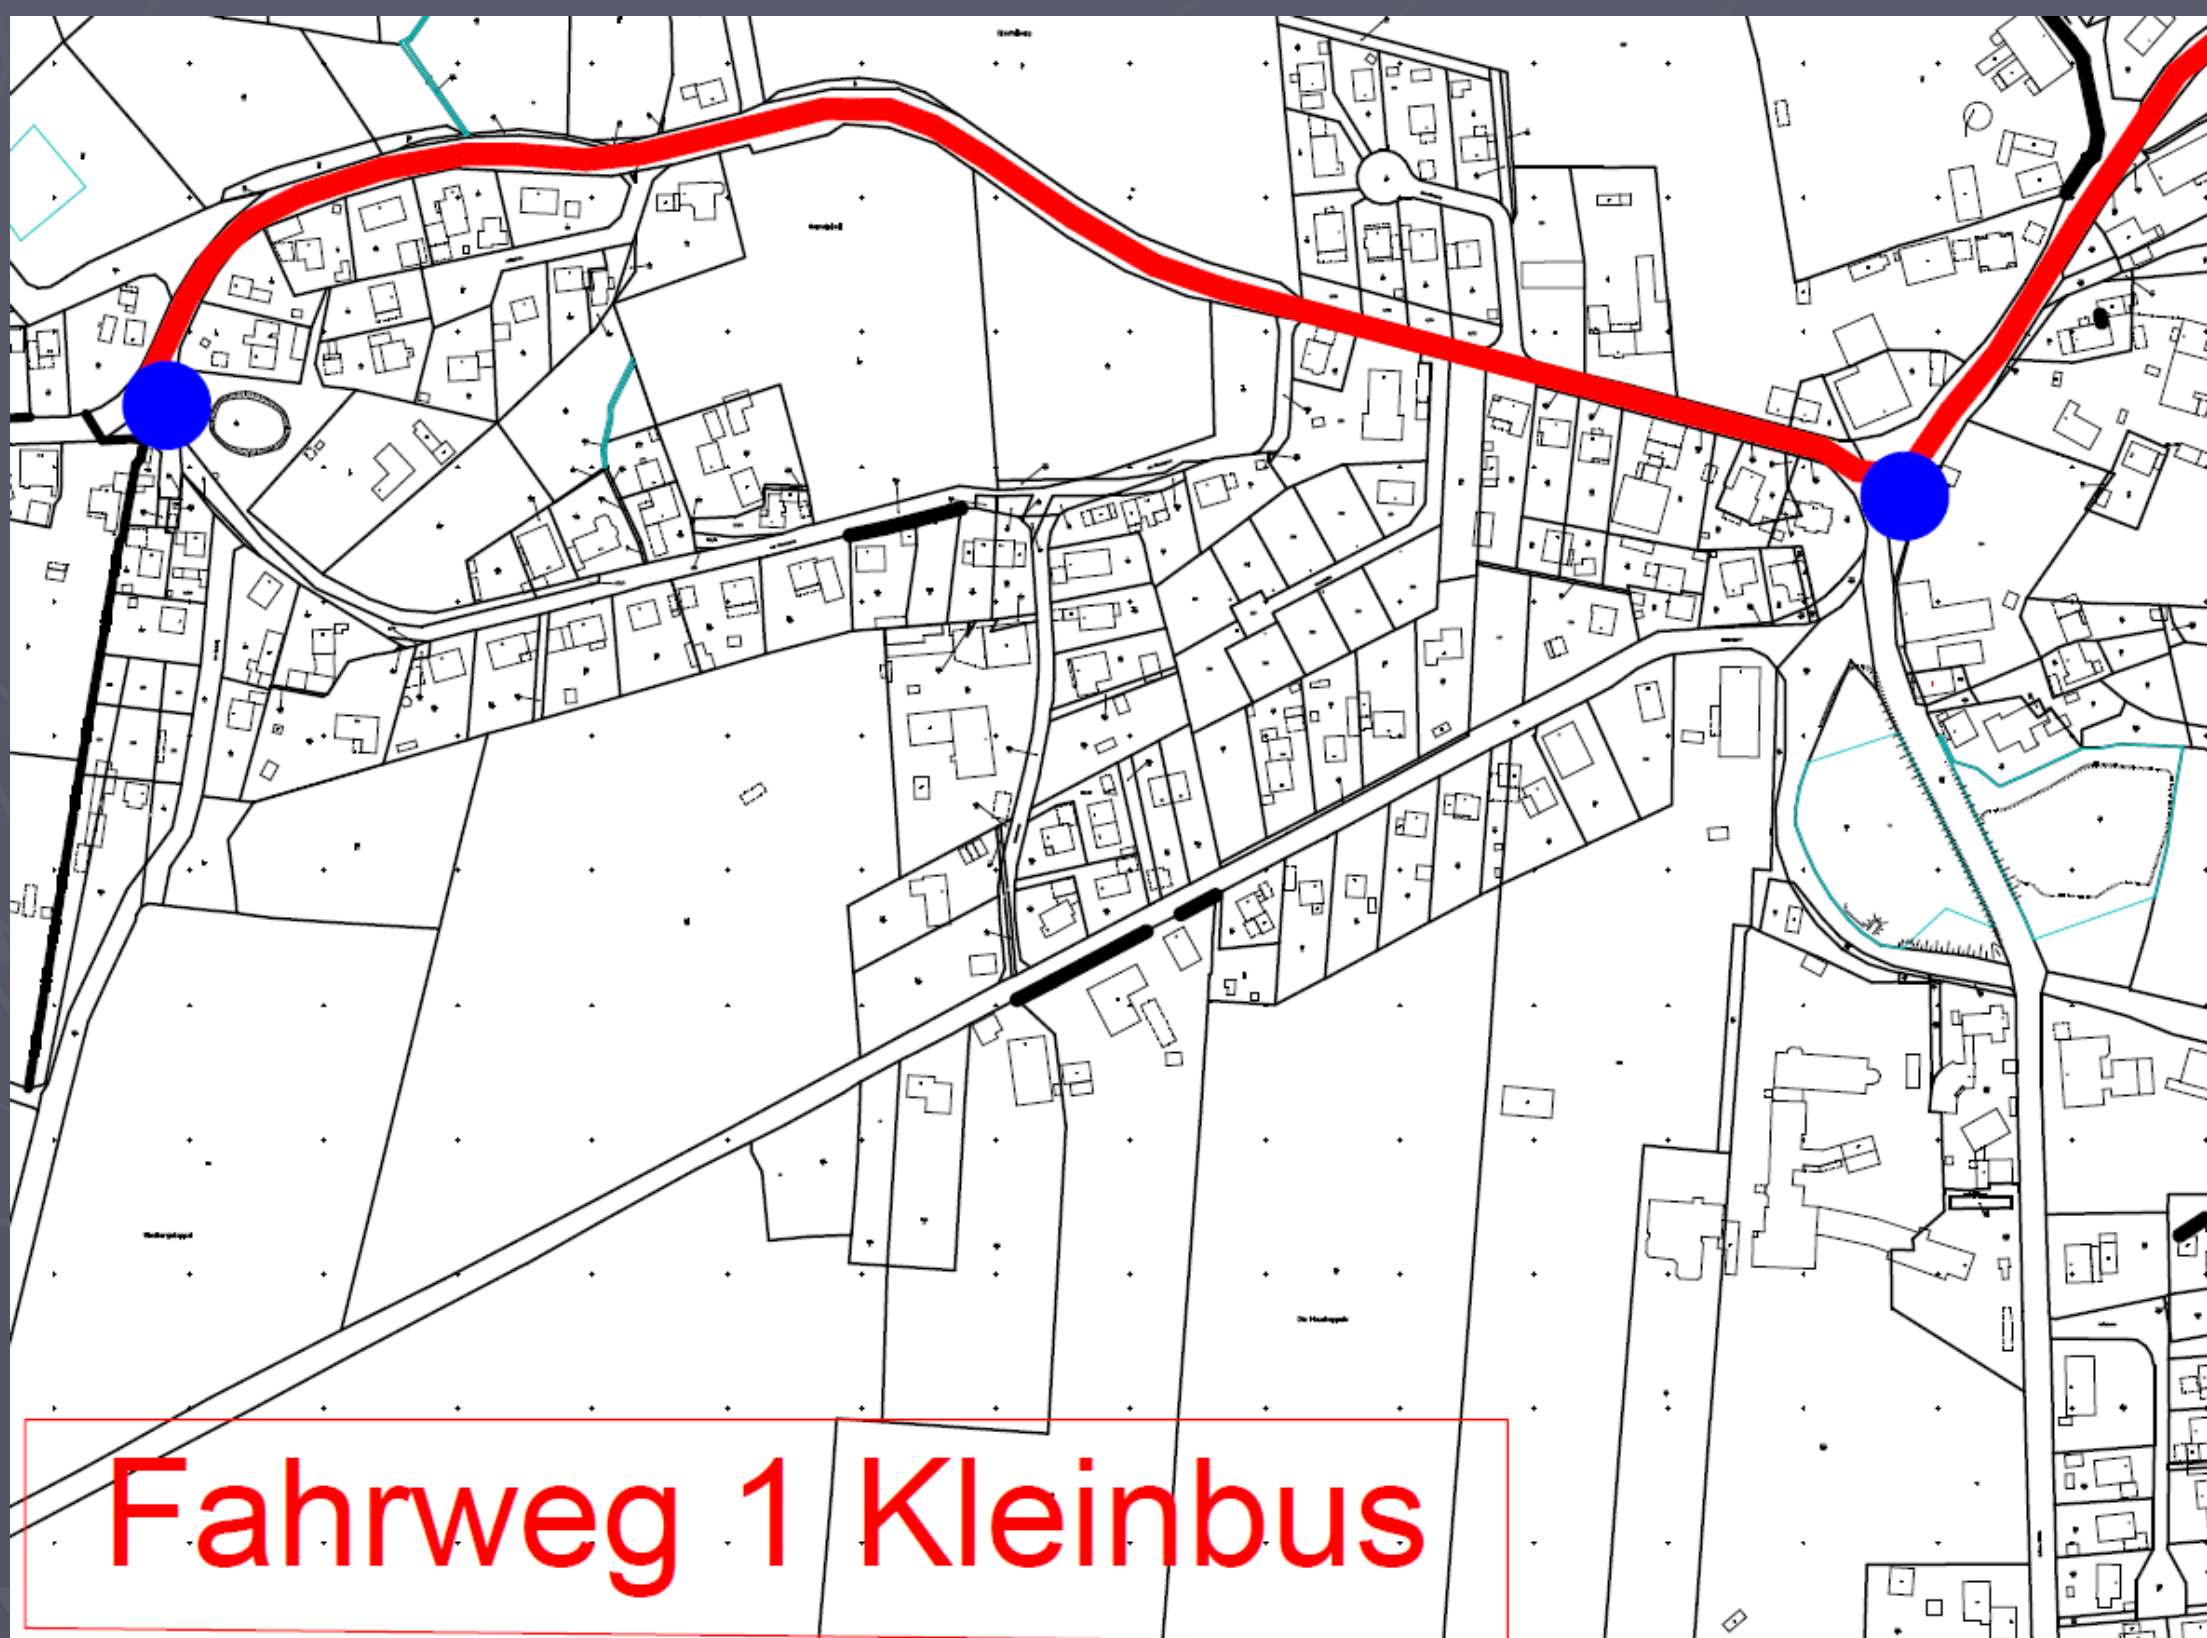

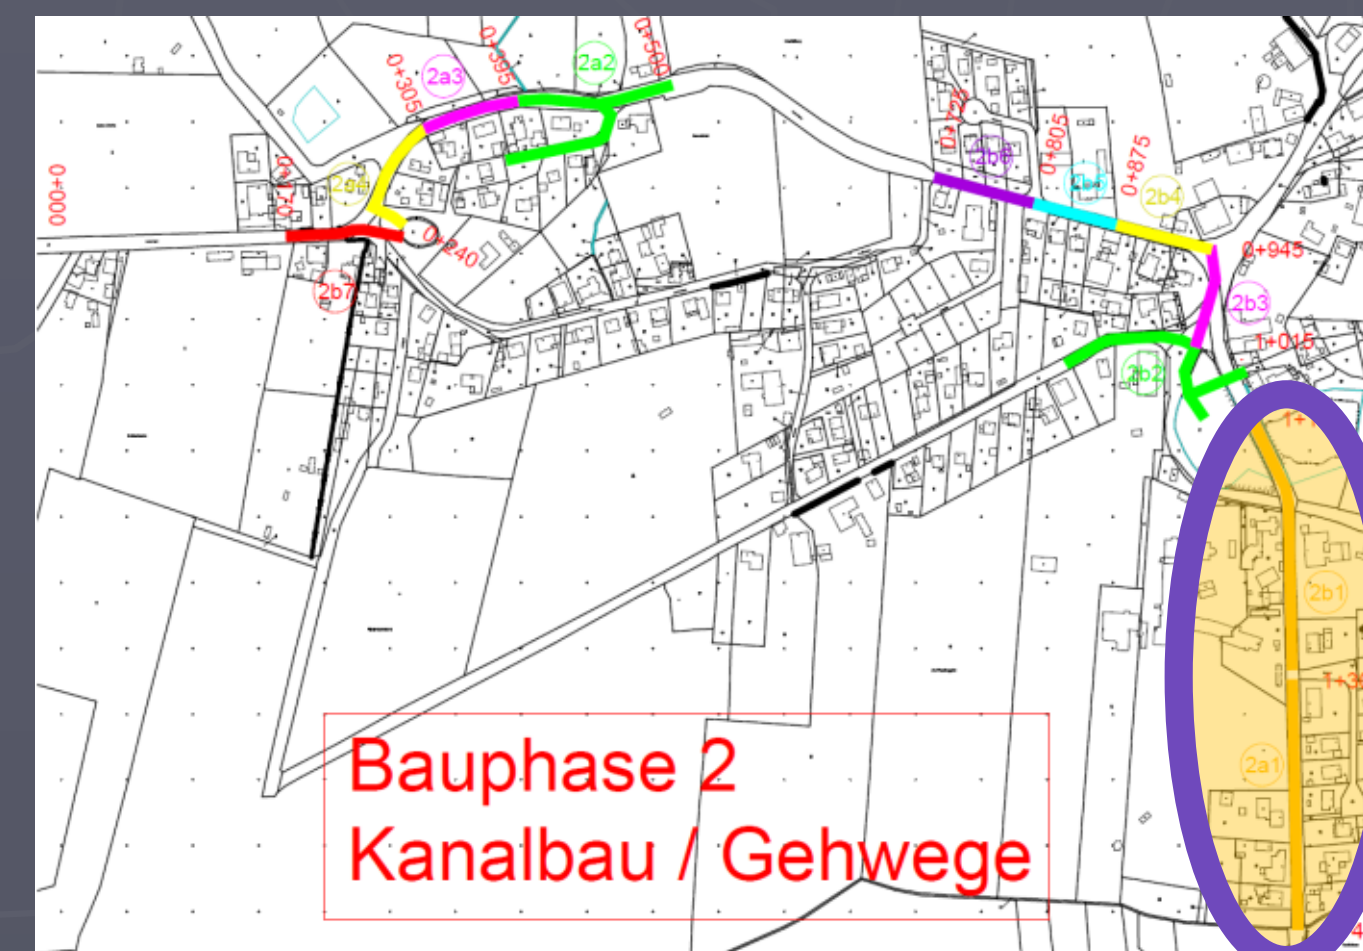

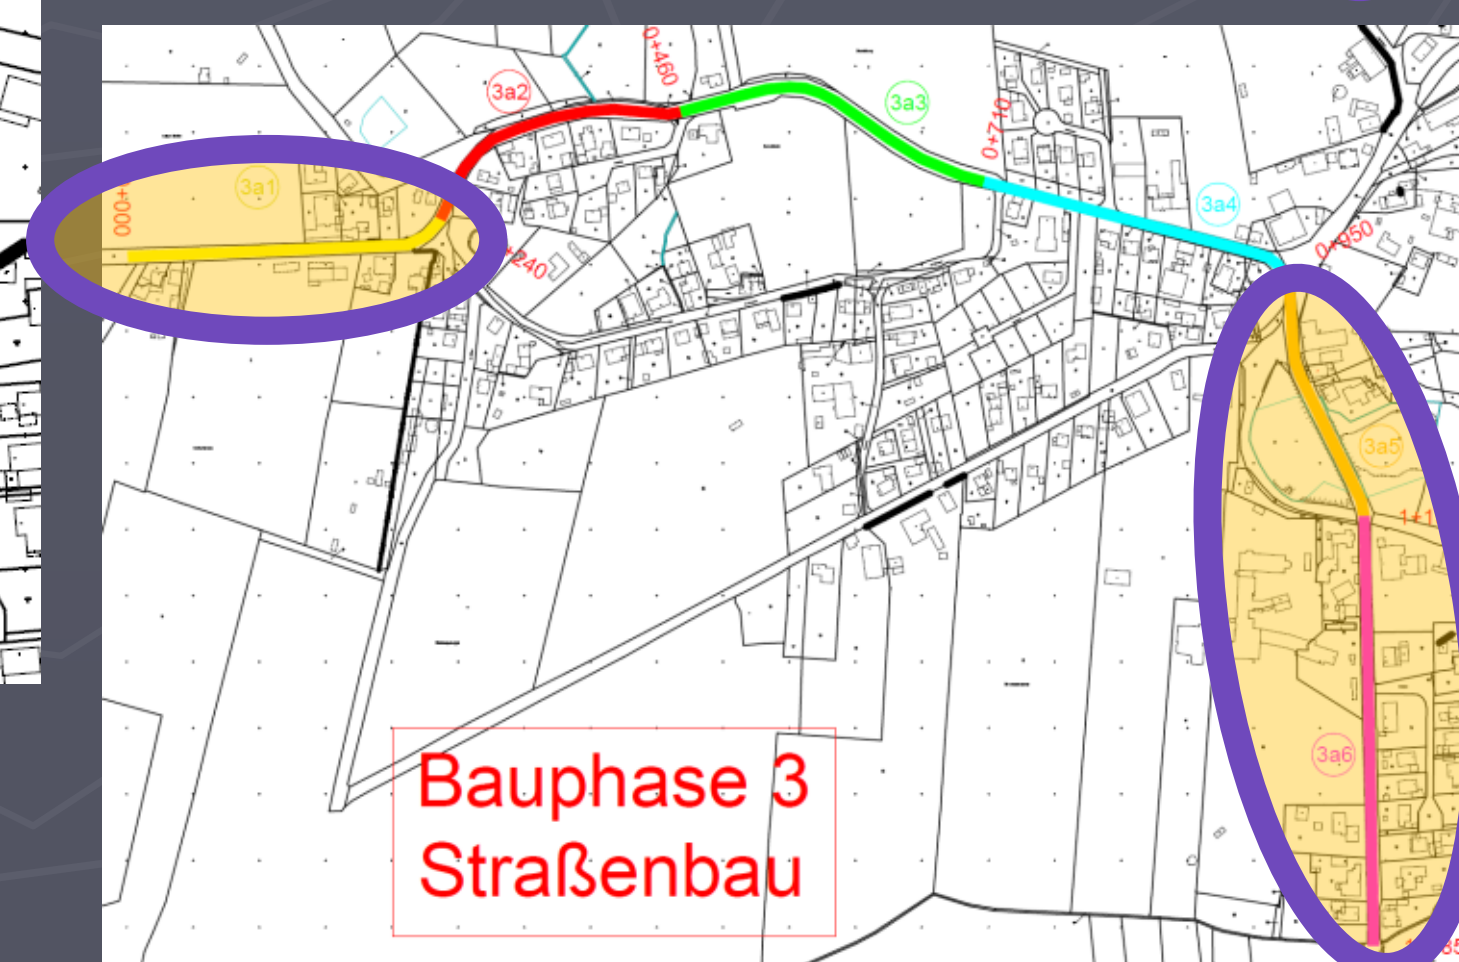

Fahrwege Kleinbus

Bauphase	Arbeiten	Phase	Station	Länge	Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Bemerkungen
					Schulferien			Oster-ferien													Sommerferien														Herbst ferien					
					Vollsperrung + Anlieger bis Bst.																																				
					Vollsperrung																																				
					Fahrweg Kleinbus	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	

25.03.2019	01.04.2019	08.04.2019	15.04.2019	22.04.2019	29.04.2019	06.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	24.06.2019	01.07.2019	08.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	29.07.2019	05.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	02.09.2019	09.09.2019	16.09.2019	23.09.2019	30.09.2019	07.10.2019	14.10.2019	21.10.2019	28.10.2019	04.11.2019	11.11.2019	18.11.2019

Osterferien
04.04. - 18.04.2019
Sommerferien:
01.07. - 10.08.2019
Herbstferien:
04.10. - 18.10.2019

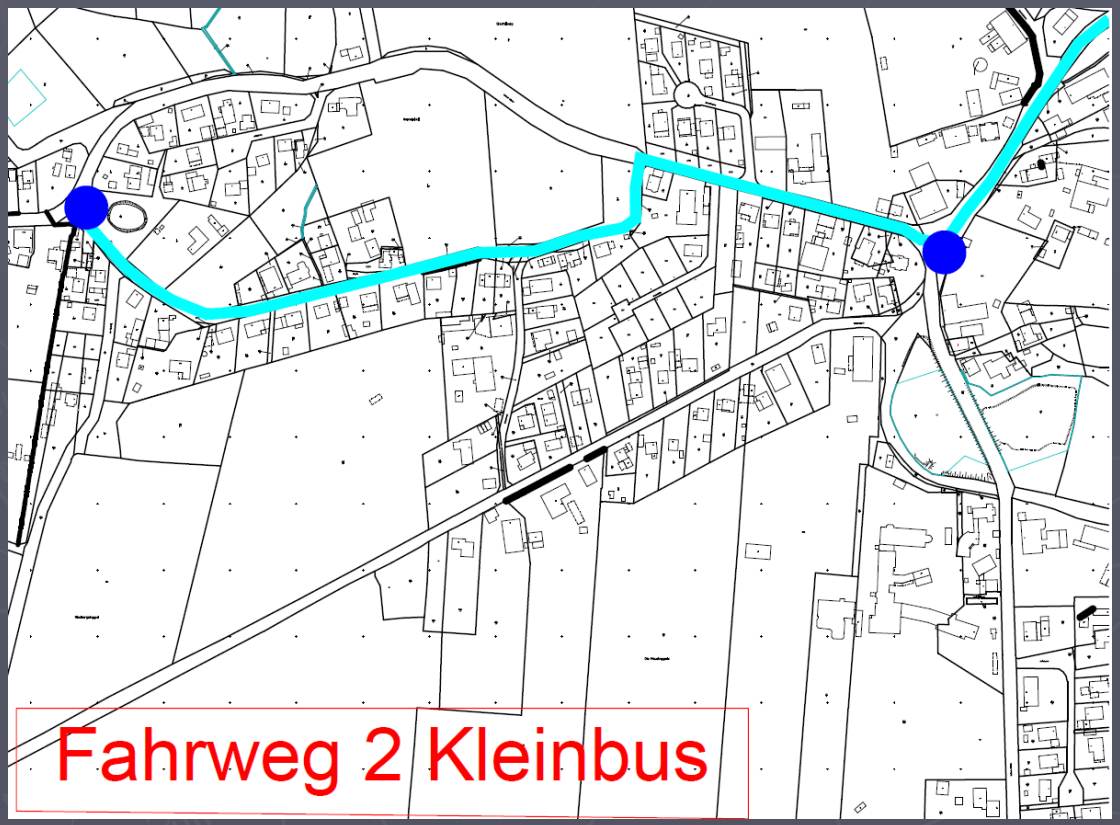

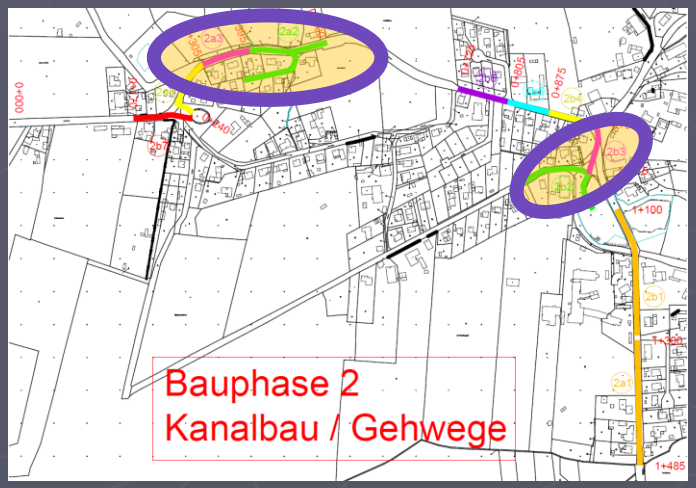

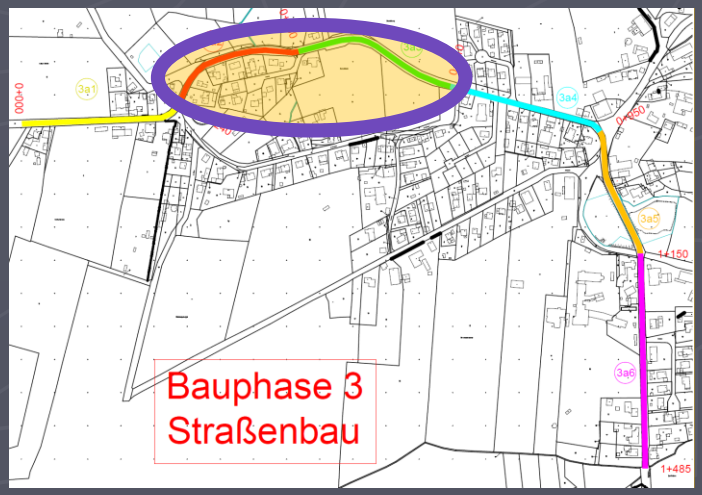

Fahrwege Kleinbus

Bauphase	Arbeiten	Phase	Station	Länge	Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Bemerkungen
					Schulferien			Oster-ferien													Sommerferien														Herbst ferien					
					Vollsperrung + Anlieger bis Bst.																																				
					Vollsperrung																																				
					Fahrweg Kleinbus	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	

25.03.2019	01.04.2019	08.04.2019	15.04.2019	22.04.2019	29.04.2019	06.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	24.06.2019	01.07.2019	08.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	29.07.2019	05.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	02.09.2019	09.09.2019	16.09.2019	23.09.2019	30.09.2019	07.10.2019	14.10.2019	21.10.2019	28.10.2019	04.11.2019	11.11.2019	18.11.2019

Osterferien
04.04. - 18.04.2019
Sommerferien:
01.07. - 10.08.2019
Herbstferien:
04.10. - 18.10.2019

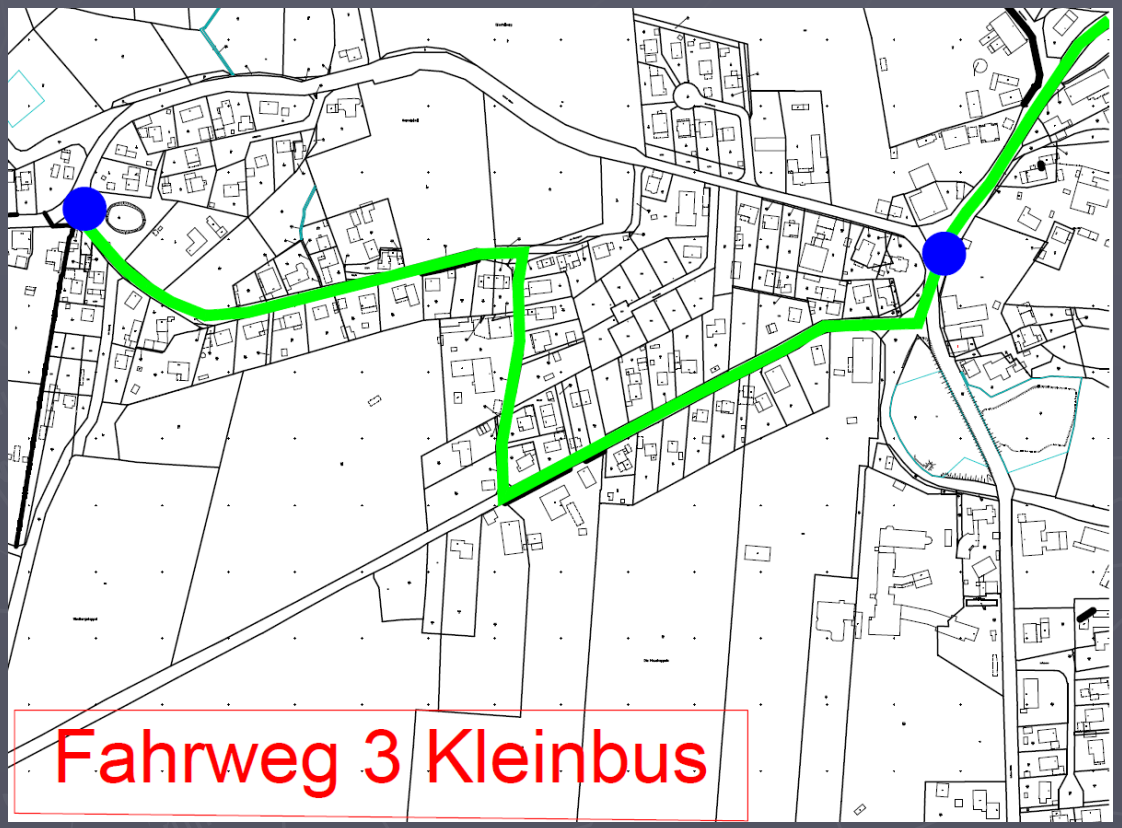

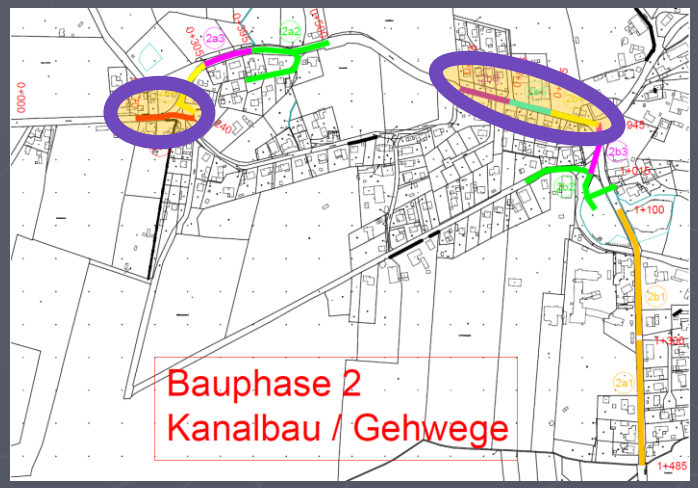

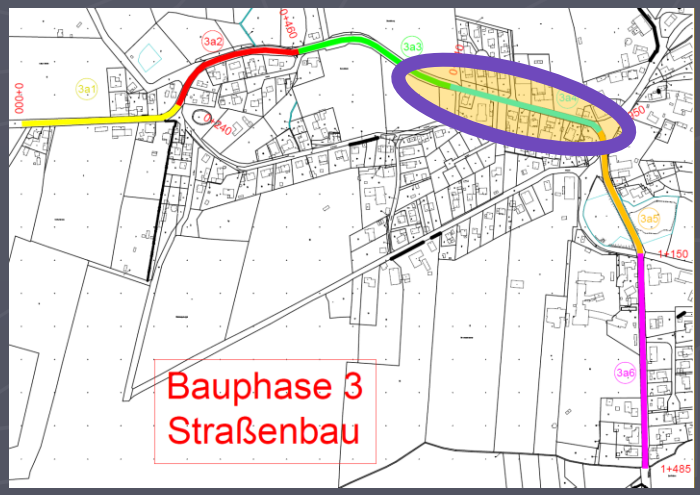

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

SH

Landesbetrieb
Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein

Niederlassung Lübeck

INGENIEURGEMEINSCHAFT
• STORM • BÜRAU •
GbR
Planung • Beratung • Bauleitung • Projektsteuerung

Fritz-Reuter-Straße 9
23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881/718191, Fax: 718393

Gartenstraße 2
23611 Bad Schwartau
Tel.: 0451/8104626, Fax: 8104627

GSP
Ingenieurgesellschaft mbH
Gosch-Schreyer-Partner
Beratende Ingenieure (VBI)
